

**ООО «Штиль»**

(наименование ведомства, наладочной организации)

**ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**

Объект Суши-бар по адресу:  
г.Воронеж, Московский проспект 90/1  
"Рынок Воронежский"

Зона (цех) Местный отсос от кухонного оборудования

**А. Общие данные**

1. Назначение системы Вытяжная система В1

2. Местонахождение оборудования системы территория арендатора

**Б. Основные технические характеристики оборудования системы**

**1. Вентилятор**

Данные	Тип	№	Диаметр колеса Дном, мм	Подача, м3/час	Полное давление, Па	Диаметр шкива, мм	Частота вращения, об/мин
По проекту	VC-315	-	315	1575	50	-	2700
Фактически	VC-315	-	315	1610	45	-	2700

Примечания Вентилятор канальный

**2. Электродвигатель**

Данные	Тип	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	Диаметр шкива, мм	Вид передачи
По проекту	встроенный	0,25	2700	-	На одном валу
Фактически	встроенный	0,25	2700	-	На одном валу


Примечания Электродвигатель комплектный

**3. Воздуонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные**

Данные	Тип или модель	Число	Схема		Вид и параметры теплохладо- носителя	Опробова- ние* тепло- обменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено)
			обвязки по теплохладо- носителю	располо- жения по воздуху		
<b>Нагреватель</b>						
По проекту	отсутствует	-	-	-	-	-
Фактически	отсутствует	-	-	-	-	-
<b>Охладитель</b>						
По проекту	отсутствует	-	-	-	-	-
Фактически	отсутствует	-	-	-	-	-

\*Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации)

Врезка через статическую камеру 600x400 в существующий воздуховод

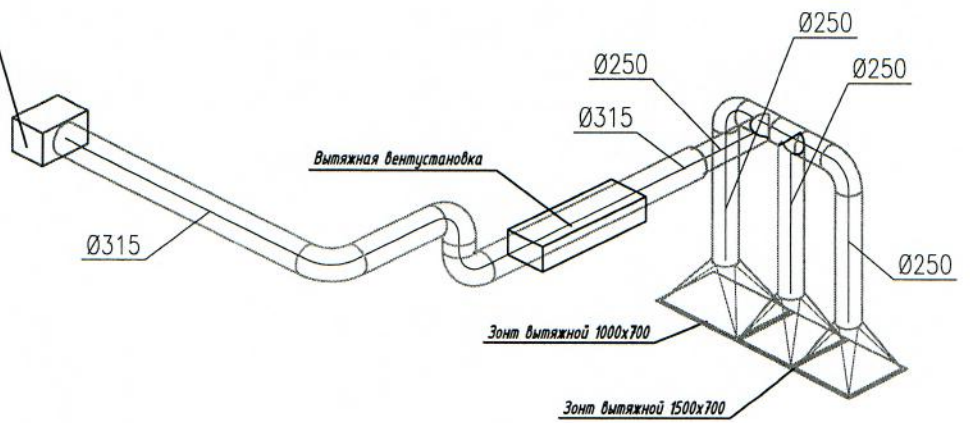

Примечания \_\_\_\_\_

4. Увлажнитель воздуха

Данные	Насос				Электродвигатель			Характеристика увлажнителя
	тип	подача, мг/ч	давление перед форсункой, кПа	частота вращения, об/мин	тип	мощность, кВт	частота вращения, об/мин	
По проекту	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-
Фактически	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-

Примечания \_\_\_\_\_

*отсутствует*

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

Номер мерного сечения	Наименование помещений	Расход воздуха, м3/ч		Невязка, % (отклонения показателей)
		фактически	по проекту	
1	Зонт №1	637	630	
2	Зонт №2	973	945	

Схема системы вентиляции В1

Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

Представитель заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель монтажной организации

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

